

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero-febrero
Año:	2017
Fecha de envío:	03 de marzo de 2017
Dependencia:	Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Dirección de Cooperación Externa
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. German Rafael González Díaz
Correo electrónico:	german.gonzalez@sesan.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Hercilia Cecibel Juárez Bonilla de Flores
Correo electrónico:	cecibel.juarez@sesan.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Ing. Marvin Eduardo De Paz Ramírez
Correo electrónico:	marvin.depaz@sesan.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Correo Electrónico:	otto.velasquez@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
3.1.2	No. de Donación	DCI-ALA/2008/020-396
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	163-2010
3.1.4	Fuente Cooperante	Comunidad Económica Europea
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	8ª. Avenida 13-06, zona 1
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2411-1900
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	8ª. Ave. 13-06, zona 1

8A Avenida 13-06, Zona 1 Teléfono: 2411 1900

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	11	12	09
3.2.2	Fecha de inicio	11	12	09
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	26	05	10
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución (operativa)	10	02	15
3.2.5	Fecha de finalización original	10	12	13
3.2.6	Fecha de finalización vigente	10	08	15

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Addendum No. 1	01/04/2011	Ampliación del monto y período de aplicación
2	Addendum No. 2	27/12/2012	Ampliación del período de aplicación, se modifica el presupuesto y se incluye el PHO

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	X
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso	SI	Informe de Estabilidad Macroeconómica, Gestión de las finanzas públicas y Política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN)
3.6.2.2	Cuarto desembolso Quinto desembolso	SI	Cumplimiento de indicadores
3.6.2.3	Desembolso Final		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	Segundo semestre 2014	

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero *	

*Corresponde a la Asistencia Técnica que cita el convenio y ejecuta la cantidad de Euros 3.3 millones

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

*en el caso de la Asistencia Técnica citado dentro del Convenio de Financiación

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Código de la Institución	11130016- 235	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante 0409
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	061	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto 30

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original (en millones)	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	€ (Euros)	33.8	1.4546	409,015,986.25
+/-	Enmiendas	€ (Euros)	6.5	1.41005	70,210,513.90
=	Monto total Fondos de Donación	€ (Euros)	40.3	-----	479,226,500.15
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-----	-----	-----	-----
3.9.3	Otros aportes	-----	-----	-----	-----
3.9.4	Monto total	€ (Euros)	40.3*	-----	479,226,500.15

3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	€ (Euros)	3.3**	***	
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	€ (Euros)	37.0	-----	

*) Monto Total del Convenio Marco, el cual incluye desembolsos proporcionados a otras instituciones ejecutoras del PESAN y los fondos (**) de Asistencia Técnica de APSAN o DUE, que no ingresan al presupuesto de la SESAN

*** Conforme lo establece el Convenio de financiación artículo 2 numeral 2.2 y artículo 7 numeral 7.2.2

8A Avenida 13-06, Zona 1 Teléfono: 2411 1900

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	N/A		
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	N/A		

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
3.12.2	Objetivo específico 1	Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país.
3.12.3	Objetivo específico 2	Promover el acceso de la población a la canasta básica alimentaria.
3.12.4	Objetivo específico 3	Promover la educación, información y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la reducción crónica.
3.12.5	Objetivo específico 4	Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para reducir la desnutrición crónica.
3.12.6	Objetivo específico 5	Fortalecer las capacidades institucionales de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional -SINASAN- y de la Sociedad Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13		Beneficiarios del Programa o Proyecto			
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores	
		SI	SESAN	INDECA / MINFIN / ICTA / INE / INFOM / SOSEP INSIVUMEH / MAGA / MARN / MINECO MINTRAB / MSPAS / SE-CONRED / MINEDUC	
3.13.2	Personas	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
		Urbana	N/A	N/A	N/A
		No Indígena			
		Indígena			
		Rural	N/A	N/A	N/A
		No Indígena			
		Indígena			
TOTAL	N/A	N/A	N/A		

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluirl los desembolsos por pagos directos)

No.	Fecha*	Monto €	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	23/12/2009	9,000,000.00	1.43	107,129,723.34
2	03/06/2011	6,500,000.00	1.44	73,360,997.27
3	06/06/2011			(1,001.35)**
4	03/06/2011			(846.49)**
5	22/11/2011	1,923,217.03	1.34975	20,256,499.07
	22/11/2011			(944.91)**
	22/11/2011			(790.06)**
	24/12/2012	2,000,000.00	1.32	21,019,097.77
	24/12/2012	3,853,920.52	1.32	40,503,696.87
6	22/05/2014	2,575,708.30	1.36573	27,219,254.18
7	07/12/2015	3,303,946.61	1.08400	27,256,230.46
4.1.1	Monto Total	29,156,792.46		316,741,916.15

*Fecha real, según el histórico de MINFIN. **Comisión bancaria

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	Indicador*	Ponderación	Total	Valor	Total	Solicitud	Desembolso estimado
		%					(€)
2	Prevalencia de la desnutrición crónica (talla/edad) en niños y niñas menores de 5 años	25	2,375,000	1	2,375,000	100%	2,375,000
5	5a) Producción de granos básicos: Frijol	7	665,000	1	665,000	100%	665,000
	5b) Producción de granos básicos: Maíz	8	760,000	1	760,000	100%	760,000
7	7a) Índice de cobertura de servicios de saneamiento ambiental	10	950,000	1	950,000	100%	950,000
	7b) Índice de cobertura de servicios de agua potable	15	1,425,000	1	1,425,000	100%	1,425,000
Total desembolso Segundo Pago, 2do. Tramo Variable		65	6,175,000		6,175,000		6,175,000

En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

Ver indicaciones en instructivo.

La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
	N/A			
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
2010	96,662,602.82		
2011	90,801,219.57		
2012	9,192,358.02		
2013	44,418,658.64		
2014	36,509,537.60		
2015	15,978,540.48		
2016	14,481,652.68		
2017		2,450,071.43	
ACUMULADO			310,494,641.24

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	0.00	14,496,000.00	14,496,000.00	0.00	0
Febrero	0.00		14,496,000.00	2,450,071.43	16.90

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Enero: Con Acuerdo Gubernativo Número 12-2017, se autorizó una ampliación presupuestaria que incorpora la fuente 61 Donaciones externas y asignación de recursos para contratar personal y gastos con cargo a: Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico" –APSAN
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.3.2	Monto Ejecutado							
5.3.3	% de ejecución bimestral/año							

VI. AVANCE FÍSICO

AVANCE INDICADORES AL MES DE 30 DE ABRIL DE 2015

INDICADORES							
Indicadores de Resultado		Meta 2012	Alcance 2012-2013	Porcentaje actual de cumplimiento	Meta 2013	Alcance 2013-2014	Porcentaje de cumplimiento meta 2013-2014
Indicadores							
Indicador 1	Ejecución Presupuestaria (1)	75%	84.86%	113.15%	0.00	N/A	N/A
Indicador 2	Prevalencia de desnutrición crónica (2)	1.5%	1.7%	113.33%	61.9%	58.20%	-3.70%
Indicador 3	Brecha Salario Mínimo **	0.986	0.924	93.71%	0	N/A	N/A
Indicador 4	Tasa Bruta Rural Nacional (3)	51.98%	58.40%	112.35%	0	N/A	N/A
Indicador 5 a	Producción de frijol (miles de quintales) (4)	4,610.80	4,811.44	104.35%	4,811.70	4,836.80	101%
Indicador 5b	Producción de maíz (miles de quintales) (5)	36,117.20	37,142.33	102.84%	37,158.60	38,003.70	102%
Indicador 6	Capacidad de Almacenamiento de granos básicos (Toneladas Métricas)	138,000	128,870.45	93.38%	0	N/A	N/A
Indicador 7a	Inversión pública en agua y saneamiento (7)	Q519,079,651	Q466,066,315	89.79%	519,079,651	523,797,641	101%
Indicador 7b	Inversión pública en sistemas de agua (6)	Q1,179,778,666	Q1,207,768,733	102.37%	1,179,778,666	1,207,768,733	102%

Fuente: Informe de cumplimiento de Indicadores del Programa APSAN 2012-2013, 2014

Alcance 2012-2013
(1) Meta superada en un 13.15%
(2) Meta superada en un 13.33%
(3) Meta Superada en un 12.35%
(4) Meta superada en un 4.35%
(5) Meta superada en un 2.84%
(6) Meta superada en un 2.3%

Alcance 2013-2014
(2) Meta Superada en 0.2%
(4) Meta Superada en 1%
(5) Meta Superada en un 2%
(6) Meta Superada en un 2%
(7) Meta superada

** En reiteradas ocasiones se solicitó a la UE la congelación de este indicador, lo cual no fue posible

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	100
--	---	-----

8A Avenida 13-06, Zona 1 Teléfono: 2411 1900

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento *** [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	PLAN DEL PACTO HAMBRE CERO	Alta Verapaz Baja Verapaz Chimaltenango Chiquimula El progreso Escuintla Guatemala Huehuetenango Izabal Jalapa Jutiapa Peten Quetzaltenango Quiche Retalhuleu Sacatepéquez San marcos Santa rosa Sololá Suchitepéquez Totonicapán Zacapa	N/A	N/A
Total		22		

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

*** Territorio Nacional.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	98%	100%	16.90%

** Se cuantifica a través del cumplimiento de los indicadores

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Carla Vidalia Guillén Martínez Asistente Técnico de Planificación y Monitoreo	Hercilia Cecibel Juárez Bonilla de Flores Directora Financiera
Firma 	Firma  HERCILIA JUÁREZ BONILLA DIRECTORA FINANCIERA Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN
Revisado por Subsecretario Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Ing. Marvin Eduardo De Paz Ramírez Subsecretario Administrativo	Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Firma  Ing. Marvin Eduardo De Paz Ramírez SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN	Firma  Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Ing. German Rafael González Díaz Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional	
Firma  Ing. German Rafael González Díaz SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN	

Fecha del informe: 03 de marzo de 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

CORRELATIVO = 0030

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/03/2017

HORA : 8:37.15

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	14,496,000.00	14,496,000.00	0.00	2,450,071.43	2,450,071.43	2,438,071.43	12,045,928.57	12,045,928.57	12,000.00	16.90
TOTAL :	0.00	14,496,000.00	14,496,000.00	0.00	2,450,071.43	2,450,071.43	2,438,071.43	12,045,928.57	12,045,928.57	12,000.00	16.90

028

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de Impresión: 03/03/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.
No. de Donación: 2014/SPE/000040007
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 2/7/2014
Fecha de inicio: 14/10/2014
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018
Fuente Cooperante: España

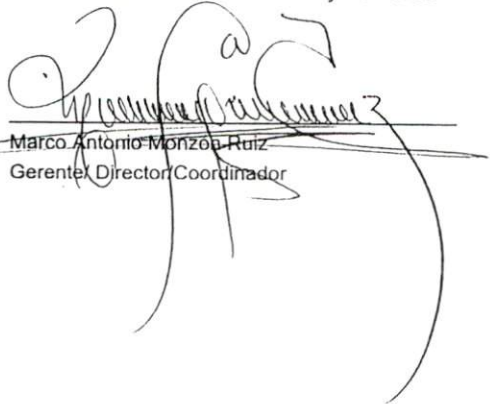
III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 2,902,257.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 2,902,257.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,160,677.97
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,160,677.97
% Avance Financiero:	74.45
% Avance Físico:	89.70

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR



Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez
Asistente Técnico de Planificación y Monitoreo



Marco Antonio Monzón Ruiz
Gerente Director/Coordinador



Sergio Hugo González Oriano
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SESAN

Responsable Área Técnica: Sergio Hugo González Oriano
Director de Fortalecimiento Institucional

German Rafael González Díaz
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ing. German Rafael González Díaz
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de envío: 03/03/2017
Dependencia: Dirección de Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico: marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. German Rafael González Díaz
Correo Electrónico: german.gonzalez@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI43
Nombre del Programa/Proyecto: Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
No. de Donación: 2014/SPE/000040007
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 86-2014
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8a. avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 24111900 ext 104
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario.
Objetivo(s) Especifico(s): Mejorar la capacidad de diagnóstico, planificación y ejecución en favor de SAN de los gobiernos locales y líderes comunitarios en 3 municipios del Occidente de Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 2/7/2014
Fecha de inicio: 14/10/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/9/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 13/10/2017
Fecha de finalización original: 13/4/2017
Fecha de finalización vigente: 13/4/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
2014/SPE/000400077	23/9/2016	20/12/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 13/4/2017 POR 13/4/2018 Y EJECUCIÓN: 13/10/2016 POR 13/10/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

3100

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, cuando se cumplan los requerimientos de apertura de cuenta.	
	en un pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cual estará vinculada totalmente al código de fuentes específicas de la donación. Sólo admitirá los registros contables a la ejecución de los fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento.	

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 11130160235603100

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:		300,000.00		2,902,257.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	9.67419	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		300,000.00		2,902,257.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
14/10/2014	300,000.00	9.67419	2,902,257.00
Total:	300,000.00		2,902,257.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,160,677.97	74.45%
Total	2,902,257.00	0.00	2,902,257.00	2,160,677.97	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	504,000.00	1,504,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,000,000.00	1,504,000.00	94,000.00	6.25
Total:	504,000.00		94,000.00	6.25

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	298,000.00	391,641.58	29,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fortalecer el monitoreo de la situación SAN para mejorar la gobernanza local a nivel departamental, municipal y comunitario	1.24 %	89.70 %
Total:	1.24	89.70

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	43,000.00
Total	0.00	43,000.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
74.45 %	89.70 %	6.25 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos
Ejecución Financiera
Ejecución presupuestaria
Ejecución física

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

CORRELATIVO = 0100

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/03/2017
 HORA : 8:35.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,000,000.00	504,000.00	1,504,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	6.25
TOTAL :	1,000,000.00	504,000.00	1,504,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	6.25

033

0010



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de impresión: 03/03/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
Dependencia: Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
No. de Donación: 2015DEA013
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 28/12/2015
Fecha de inicio: 1/8/2016
Fecha de finalización vigente: 30/9/2018
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 2,430,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,361,220.24
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 222,651.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 222,651.00
% Avance Financiero:	9.16
% Avance Físico:	2.86

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez
Asistente Técnico de Planificación y Monitoreo


Marco Antonio Monzón Ruiz
Gerente/Director/Coordinador


Sergio Hugo González Oriano
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIÓN
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SESAN-
Responsable Área Técnica: Sergio Hugo González Oriano
Director de Fortalecimiento Institucional


German Rafael González Díaz
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
República de Guatemala
Ing. German Rafael González Díaz
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de envío: 03/03/2017
Dependencia: Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico: marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. German Rafael González Díaz
Correo Electrónico: german.gonzalez@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
No. de Donación: 2015DEA013
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No SESAN-64-2016
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8av 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población

Objetivo(s) Específico(s): Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, actores institucionales y líderes comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones SAN, en 4 municipios de la Región Chortí del departamento de Chiquimula

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/12/2015
Fecha de inicio: 1/8/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/8/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 2/8/2018
Fecha de finalización original: 30/9/2018
Fecha de finalización vigente: 30/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Para el primer Desembolso se creó la cuenta única.	Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada por crédito publico el 05/09/2016.
FUENTE COOPERANTE	Para el segundo desembolso se tendrá que haber ejecutado al menos al 50% del primer desembolso.	12 meses

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.10000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016	168,051.88	8.10000	1,361,220.24
Total:	168,051.88		1,361,220.24

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	228,119.98	0.00	228,119.98	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	266,000.02	0.00	266,000.02	98,000.00	36.84%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	405,480.00	0.00	405,480.00	124,651.00	30.74%
Total	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	222,651.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,115,000.00	1,115,000.00	98,000.00	8.79
Total:	0.00		98,000.00	8.79

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	728,682.11	301,505.86	294,137.07

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0 %	6.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	8.30 %	8.30 %
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0 %	0.00 %
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0 %	0.00 %
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0 %	0.00 %
Total:	1.66	2.86

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUIMULA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
9.16 %	2.86 %	8.79 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

CORRELATIVO = 0107

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/03/2017

HORA : 8:36.15

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0235 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	8.79
TOTAL:	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	8.79

039



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de impresión: 03/03/2017

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI30
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 29/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016
Fuente Cooperante: España


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 4,781,070.30
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,781,071.37
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,781,071.37
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Carla Vidalia Guillén Martínez
Asistente Técnico de Planificación y Monitoreo


Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Gerente/ Director/Coordinador


Responsable Área Técnica: Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Director de Planificación, Monitoreo y Evaluación


Ing. German Rafael González Díaz
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2017
Fecha de envío: 03/03/2017
Dependencia: Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Otto Estuardo Velásquez Vásquez
Correo Electrónico: otto.velasquez@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. German Rafael González Díaz
Correo Electrónico: german.gonzalez@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI30
Nombre del Programa/Proyecto: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.
No. de Donación: Subvención 2012/SPE/400182
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución de Concesión de Subvención No. 2012/SPE/0400182
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.

Objetivo(s) Especifico(s): 1. Objetivo I, Sistematización de un modelo de intervención integral del Pacto Hambre Cero en el territorio. 2. Objetivo II, Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de impacto del Plan Hambre Cero. 3. Objetivo III, Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de SESAN para aplicar métodos de evaluación de impacto de programas de mejora nutricional y el software especializado para el manejo de información y evaluación de proyectos.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 29/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 30/4/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/7/2015
Fecha de finalización original: 14/1/2016
Fecha de finalización vigente: 14/1/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:
Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, en un solo pago, a la Cuenta Única de donaciones en el Banco de Guatemala, la cuál estará vinculada totalmente al código de fuente específica de la donación. Sólo se admitirá los registros contables a la ejecución de fondos, o se deberá dar acceso informático en tiempo real, a la AECID, para dar seguimiento	15/04/2013 al 14/07/2015

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17249	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	470,000.00	10.17249	4,781,070.30
Total:		470,000.00		4,781,070.30
Monto Total		470,000.00		4,781,070.30

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/4/2013	470,000.00	10.17249	4,781,071.37
Total:	470,000.00		4,781,071.37

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	100.00%
Total	4,781,070.30	0.00	4,781,070.30	4,781,071.37	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	NeuN

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas y monitoreo y evaluación de impacto.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	4,781,071.37
Total	0.00	4,781,071.37

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Proyecto finalizado en proceso de cierre administrativo

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


Guatemala, 18 de enero de 2017
Oficio SESAN-40-2017

Estimado Señor Secretario:

Deseando éxitos en sus actividades, por medio de la presente y en relación al proyecto "Validar la estrategia de intervención en los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero, a través de la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación de impacto", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, me permito informarle que se encuentra en fase de liquidación, habiéndose presentado todos los documentos requeridos por el organismo donante.

Asimismo, le informo que se seguirán presentando los Informes de Avance Físico y Financiero –IAFF- de manera bimensual, mientras dure el proceso de liquidación. Sobre la información del referido proyecto en el SIGEACI, hemos detectando que se indica un monto desembolsado de Q.4,781,070.30, el cual no corresponde al ejecutado de Q4,781,071.37, por lo que agradeceré sus buenos oficios a efecto de girar las instrucciones a donde corresponda para que dichos montos sean corregidos, situación que ha sido notificada anteriormente a esa Secretaría a través de los enlaces técnicos correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.


Ing. German Rafael González Díaz
Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Presidencia de la República

Señor Secretario
Miguel Angel Moir
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
Su Despacho

C.C Archivo
Ref.: CG/OV/DPME



044
